

BESCHLUSSVORLAGE


öffentlich

 Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Planungs- und Umweltausschuss	12.11.2020	
Kreisausschuss	19.11.2020	

Betreff: Barrierefreier Ausbau der Haltestelle "Wittmund, Schulzentrum"; hier:
Anpassung der Planung

Sachverhalt: Mit Beschluss vom 11.12.2017 (Vorlage-Nr. 0139/2017) hat der Kreisausschuss die Verwaltung beauftragt, u. a. den Ausbau der Haltestelle „Wittmund, Schulzentrum“ unter Ausschöpfung der Zuwendung der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) aus dem Programm „Förderung und Investitionen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)“ in 2020 durchzuführen. Aufgrund der Preisentwicklung war eine Anpassung der Kosten mit Beschluss des Kreisausschusses vom 11.12.2019 (Vorlage-Nr. 0144/2019) auf 1.066.000 € vorgenommen worden. Der Förderantrag bei der LNVG wurde fristgerecht eingereicht.

Aufgrund der Ereignisse beim Ausbau der Haltestelle "Friedeburg, Schulzentrum" ist das beauftragte Planungsbüro von seinem Auftrag zurückgetreten. Das Ingenieurbüro IST aus Schortens hat den Auftrag übernommen und die bestehende Planung überarbeitet. Es schlägt die aus der nachfolgenden Skizze ersichtliche Umsetzung vor:

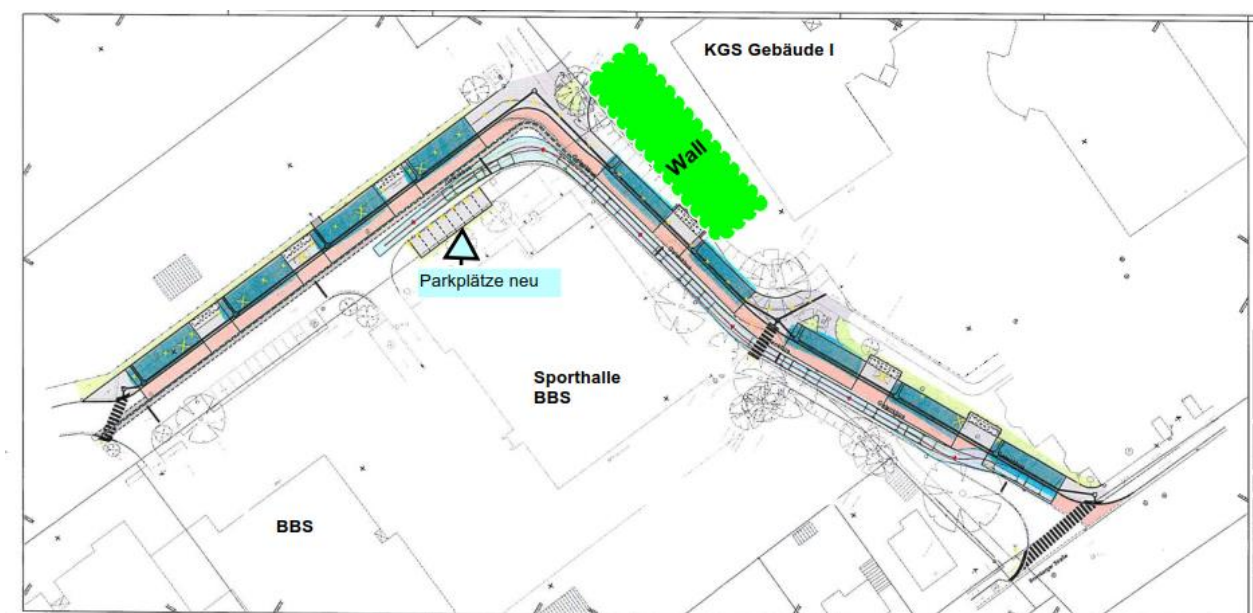

Es ergeben sich folgende Veränderungen gegenüber der bislang favorisierten aber nicht umsetzbaren Lösung:

- Reduzierung auf 9 Haltepositionen (dieses wurde mit den Verkehrsunternehmen besprochen), dadurch Nutzung durch alle Fahrzeuggrößen an jeder Halteposition
- Eine Abtragung des Walls ist nicht notwendig, eine Oberflächenversiegelung ist nur geringfügig notwendig. Bestehende Pflanzen und Bäume bleiben unberührt. Der Bewuchs trägt wesentlich zur Beschattung und Schallreduzierung des E-Traktes der KGS bei.
- Eine Querung der Schüler von Fahrbahnen ist nicht mehr notwendig.
- Eine Grobkostenschätzung mit einem Kostenpuffer von ca. 10 % geht von Gesamtkosten in Höhe von ca. 975.000 € statt der geplanten 1.066.000 € aus.

Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

Planung IST	Wittmund
Gesamtkosten	975.000,00 €
Zuwendungsfähige Bauausgaben	825.000,00 €
max. 10% der zuwendungsfähigen Bauausgaben	82.500,00 €
Zuwendungsfähige Ausgaben gesamt	907.500,00 €
Zuwendung des Landes (75%)	680.625,00 €
Regionalisierungsmittel LK WTM (25%)	226.875,00 €
Fördersumme gesamt	907.500,00 €
Eigenmittel (Haushalt)	67.500,00 €

In den Eigenmitteln sind die Kosten für den Bau von 8 neuen Parkplätzen enthalten, da diese nicht zuwendungsfähig sind. Durch die Umplanung ergibt sich eine Verschiebung der Kosten aus dem nicht zuwendungsfähigen Bereich in den zuwendungsfähigen Bereich, so dass der Eigenanteil des Landkreises von ca. 324.000 € auf ca. 67.500 € sinkt. Die Mittel sind im Haushalt 2020 veranschlagt.

Bei einem Ortstermin am 09.10.2020 wurde die neue Planung den Schulleitungen der Alexander-von-Humboldt-Schule KGS Wittmund und den Berufsbildenden Schulen für den Landkreis Wittmund vorgestellt. Sie fand dort Zustimmung, auch wenn die zunächst favorisierte aber nicht umsetzbare Lösung aufgrund ihrer Kompaktheit den Wünschen der Schulen mehr entsprach.

Finanzierung:

1. Gesamtkosten	2. jährliche Folgekosten	3. objektbezogene Einnahmen
ca. 975.000 €	Abschreibungen jährlich 2.700 € Zinsen jährlich 351 €	ca. 907.500 €

Haushaltsmittel

Produktkonto: 5.4.7.01.001/1138.7872000

Beschlussvorschlag:

Die Haltestelle „Wittmund, Schulzentrum“ wird gemäß der vorliegenden überarbeiteten Planung barrierefrei ausgebaut.

Wittmund, den 29.10.2020

gez. *Stigler* (Amtsleiter)

Abstimmungsergebnis:			
Fraktion	Ja:	Nein:	Enth.:
Fachausschuss	Ja:	Nein:	Enth.:
Kreisausschuss	Ja:	Nein:	Enth.:
Kreistag	Ja:	Nein:	Enth.:

Anlagenverzeichnis:
